

DICTAMEN DE FACTIBILIDAD

PACHUCA DE SOTO, HGO., A 08 DE DICIEMBRE DE 2023
ID R4099/17/11-2023
DGVTEYP/V/R33/04113/2023

C. HÉCTOR HUGO RAMÍREZ LÓPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ATOTONILCO EL GRANDE

Ejercicio Fiscal: 2023
Unidad Responsable: Municipios
Unidad Presupuestal: Atotonilco el Grande
Programa Sectorial: 20 - Inversión
Programa Presupuestario: Inversión en Municipios
Oficio y/o Solicitud: , de fecha 8 de diciembre de 2023

Datos Generales de la Obra / Acción

Ubicación: REGION XV - ATOTONILCO EL GRANDE - 12 - Atotonilco el Grande - 037 - Tezahuapa
Barrio, Colonia, Ejido: Bo. EL ZAPOTE
Nombre de la Obra / Acción: AMPLIACIÓN DE LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EL ZAPOTE.
Modalidad de Ejecución: C - Contrato

Estructura Financiera

Inversión Total	Inversión Federal	Inversión Estatal	Inversión Municipal	Inversión Beneficiarios	Inversión Rec. Propios	Inversión Otros
\$226,000.00	\$0.00	\$0.00	\$226,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Fuente de Financiamiento			FAISM			

Programa Municipal: S41 - AGUA POTABLE

Resolución: VIABLE DE TRAMITACIÓN

El presente documento administrativo No es un Oficio de Autorización de Recursos, es el resultado del estudio de factibilidad que se realizó al expediente técnico, con base en la información presentada por la Unidad Presupuestal, quien tiene la responsabilidad absoluta de su contenido y veracidad. Lo anterior con fundamento en los artículos 19, párrafo 6 y 24, párrafo 1 y 2 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo, en el que se menciona que previamente a la realización de los trabajos, se preverán la realización de los estudios y proyectos urbanísticos, arquitectónicos, de ingeniería o especializados que se requieran, las normas y especificaciones de ejecución aplicables, además se deberán tramitar y obtener de las autoridades competentes, dictámenes, permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, la propiedad o los derechos de la propiedad incluyendo derechos de vía, y expropiación de inmuebles sobre los cuales se ejecutarán las obras publicas.



ING. ELISEO VITE RAMOS / DIRECTOR GENERAL
HjpSVQcU4vS6NHLGFDrg8PJSGNkbpL8RPQIIBRJJPNIeOkugSwNhpSs8mtfY+XW/HO+JSZ4jp2AI0d
ZIXDvaxlPhzdGIP+wgKSjTzqGDp6PTImn2Y4X+U16ZGM8lqSZEj320Wpn6hB+uOnx4dpA6ypR
zEITBX/Ejp088XAYbgfYKX6G5jntRimUG3PihWJDF1AGMIZUdu47wkJ6qZrcM1+DpUuqfK2re8
mLUKq4eCvnekhx6gy7epHnmDzJ+IF8M2Vgffe1UyOE0X6wTWL7DdtJ2g6ApHNE6WnBsXC9H4gl8
jMpl/ETHBya2Rnyut1KahyykbSLJWtw==
VIRE5108281L8 08/12/2023 03:41:03 p. m.
ARQ. MEYLAN ESPEJEL MORENO / DIRECTORA DE VALIDACION DOCUMENTAL
VLXZEFnBjy98GxuKdQl6Q/r9gPm5mKJxBvNrG+kj3ZFulgOM+6B3rp+jvSjAAdG9tf77M6IDT/FNB6E
YXcmnXzEikstHRGp6D420WEAhp6WYVgv24Vfzai593IMZYCMTR5qcmisEMMjPwJjocWmsLQmLlUg
PftoBjs6cXSeLFF7kth9NapeeBrdcV1LNk0mM5eMqPAC6a6PEnAgexesVACP6qQX0a8c7/pRIZB
9oHkINPeS9MLnFPc48C7E7WYhyZnftbfc0DeYGOMBMDu2G3Of76bVPQHhuAJWlzcCqa+R6+wfCgpA
9oqv1e5l+k5u8cdTJL9Cpe0BMEYw==
EEMM780718H25 08/12/2023 02:54:25 p. m.

ARQ. LUIS TREJO SALINAS / DIRECTOR DE VALIDACION TECNICA
O74lyln+Tq2F5XujMGmRizblRo1+XWgwPv5TUqB1QoQtwO9cbEJn2RQMvgawWa73gBHxFSLkKbPcF
Z2b6g7P+mDNKJgNlRAWkTLpHl4H+5XWVVOXfx49mIxLRh6lkbxbzQGY3SR+JUpTqVQSK9AW9
FEKPCx8Wwdb8qmx9AazbYR7xMIA8OWLXVDTUL3lwBb7AFjowCbf/QQnzTxVDBrFJWC+ydH5TD
bYgKkOExsSAPqtlwa3i2EE/MyjRkd3BukiCrUsMA1dXl3KxOcuXD+S7c5UF9+vc4q9R9A7+1fb
8lb78sQiflyHLxBmw25lHrjKIDOW==
TESL770825JV3 08/12/2023 03:12:01 p. m.
ING. ARMANDO HERNANDEZ GONZALEZ / DIRECTOR DE VALIDACION SOCIOECONOMICA
dNG9WMLIynHXGM5JQJ3nMxhgApzswVgZl3S3nrr/6Va2v8o6x3bKrUua38x9ye074sAQ1B0PeTnlM1+
bc+miRyaWzV0A09q234O1zWJ95SmD0IU9TlactnKrZE11PKA7CSY6Hz01Eu3yhDqzcsDZaV3Nlnwku
le1uEj05YK8zOrGdx7oZNSJ9J04zplhWwku4h9dSn8TSLH7Q6B8ipTFJmGgT2qDhJhQvESwEBqy
ytkmcmMJUmOH4wfhWcipcNZBUObihNlF0bjKgjKd6K5jrNgoz53mWML4clNmXu28Ym+2qm
VCX54zaokN5ZhM1Axxe97We2faqlhw==
HEGA710618218 08/12/2023 03:13:48 p. m.

ID: R4099/17/11-2023

Página 1 de 3

Instancia Ejecutora

Unidad Responsable: 60 - MUNICIPIOS
Unidad Presupuestal: 12 - ATOTONILCO EL GRANDE

Obra / Acción

ID: R4099/17/11-2023 /AMPLIACIÓN DE LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EL ZAPOTE.

Datos Generales

FECHA DE INGRESO: 17/11/2023

Tipo de Solicitud:	FONDOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL	EJERCICIO FISCAL:	2023
Nombre de la Obra:	AMPLIACIÓN DE LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EL ZAPOTE.		
Descripción:	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE DISTRIBUCIÓN A BASE DE TUBERÍA DE P.V.C HIDRÁULICO CON CAMPANA RD-26 DE 50 MM (2"), CONSTRUCCION DE CAJAS DE VALVULAS Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES. LONGITUD DE 499.00 ML.		
Modalidad de Ejecución:	Contrato		
Tipo de Obra:	Ampliacion		

Estructura Financiera

	INVERSIÓN
FEDERAL	\$0.00
ESTATAL	\$0.00
MUNICIPAL	\$226,000.00
OTROS	\$0.00
TOTAL:	\$226,000.00

Calendario de Inversión

Número de Meses 1

MUNICIPAL													
Partida	Mes 01	Mes 02	Mes 03	Mes 04	Mes 05	Mes 06	Mes 07	Mes 08	Mes 09	Mes 10	Mes 11	Mes 12	Total
614001	226,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,000.00
TOTAL	226,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,000.00
TOTAL	226,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,000.00



ID: R4099/17/11-2023

Página 2 de 3

Clasificación Contable Presupuestal

Obra: - Obra - Construcciones en Proceso en Bienes del Dominio Público

Alineación PED

Ejercicio Fiscal: 2023

Ramo: 36 - INVERSIÓN EN MUNICIPIOS

Unidad Responsable: 60 - MUNICIPIOS

Unidad Presupuestal: 12 - ATOTONILCO EL GRANDE

Fuente de Financiamiento:

Tipo de Gasto: 02 - GASTO DE CAPITAL

Finalidad: 02 - DESARROLLO SOCIAL

Función: 02 - VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

SubFunción: 03 - ABASTECIMIENTO DE AGUA

Eje Temático Plan Estatal: 504 - HIDALGO CON DESARROLLO SOSTENIBLE

Programa: K0020 - INVERSIÓN

SubPrograma: 40 - INVERSIÓN EN MUNICIPIOS

Objetivo: 001 - DISMINUCIÓN DE LA CARENCIA POR ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS

Política Sectorial: 00-NO APLICA

Estrategía: 00-NO APLICA

Línea de Acción: 00-NO APLICA

Beneficiario: K01 - HABITANTES - HABITANTES

Espacio Geográfico: 12037 - 12037 ATOTONILCO EL GRANDE

Indicador Estratégico

Objetivo Transversal



ID: R4099/17/11-2023

Página 3 de 3

Indicador de
Gestión

Meta ODS: 01 - FA - LOGRAR EL ACCESO UNIVERSAL Y EQUITATIVO AL AGUA POTABLE SEGURA Y ASEQUIBLE PARA TODOS.

Indicador PED: 00-NO APLICA

Indicador Plan
Municipal 5.4 OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Responsables de la información:

C. HÉCTOR HUGO RAMÍREZ LÓPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ATOTONILCO EL
GRANDE

Titular

ARQ. CIRO NEPTALY RAMIREZ AVILA
SUPERVISOR DE OBRA

Cédula Profesional: 6646399

Enlace



ID: R4099/17/11-2023

Página 1 de 14

Version:5

Fecha y hora de Impresión: 08/12/2023 03:40:21p. m.

Instancia Ejecutora

Unidad Responsable: Municipios

Unidad Presupuestal: Atotonilco el Grande

Obra / Acción

ID: R4099/17/11-2023 / AMPLIACIÓN DE LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EL ZAPOTE.

I. Información general PPI

Tipo de PPI: Urbanización

SubClasificación:

Monto total de la Inversión

Monto total de inversión (con IVA, para registro)	\$226,000.00
Monto total de inversión (sin IVA, para evaluación)	\$194,827.59

Fuentes de Financiamiento

Origen	%	Monto (Incluye Iva)
Federal	0.00	\$0.00
Estatad	0.00	\$0.00
Municipal	100.00	\$226,000.00
Beneficiario	0.00	\$0.00
Recursos Propios	0.00	\$0.00
Inversión Otros	0.00	\$0.00
Total	100%	\$226,000.00

Horizonte de Evaluación

Inicio de ejecución	MES 01
Termino de ejecución	MES 01
Num de años de operación	30

Calendario de Inversión

Ejercicio Fiscal	Monto
2023	\$226,000.00



Localización Geográfica del Proyecto

Ubicación: Municipal

Región: XV - ATOTONILCO EL GRANDE

Municipio: 12 - 12 - Atotonilco el Grande

Localidad: 037 - Tezahuapa

Barrio, Colonia, Ejido: Bo. EL ZAPOTE

Tipo de Localidad POBLACIÓN RURAL

Localización:

El municipio de Atotonilco el Grande colinda al norte con los municipios de Metztlán y San Agustín Metzquitlán; al este con el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y con el municipio de Huasca de Ocampo; al sur con los municipios de Huasca de Ocampo, Omitlán de Juárez y Mineral del Chico; al oeste con los municipios de Mineral del Chico, Actopan y Metztlán. De acuerdo con los resultados que presentó la Encuesta Intercensal 2015 INEGI, el municipio cuenta con un total de 27,433 habitantes.



" ESTAMOS TRABAJANDO Y PROMOVIMOS LA EQUIDAD DE GÉNERO "



II. Alineación Estratégica

Federal

(en caso que aplique)

Estatat

Programa Relacionado	Objetivo/Estrategia	Linea de Acción
05 - Hidalgo con desarrollo sostenible	01 - Disminución de la carencia por acceso a los servicios básicos	
04 - Infraestructura Sostenible		

Proyectos Relacionados

(en caso que aplique)



III. Análisis de la situación actual

Descripción de la Problemática:

El Municipio de Atotonilco el grande cuenta con una cobertura de servicios básicos en Agua Potable, Drenaje, Electrificación, Salud, Comunicación (Telefonía u Otro), Urbanización y Educación.

El municipio en toda su extensión presenta una diversidad de climas que va desde el templado subhúmedo con lluvias en verano , hasta el semiseco templado, predominando el primero en la superficie municipal. Su temperatura promedio mensual oscila, entre los 12°C para los meses de diciembre y enero que son los más fríos del año y los 18°C para el mes de mayo que registra las temperaturas más altas.

En la localidad de TEZAHUAPA, se tiene déficit en el servicio de agua potable, la problemática que enfrenta esta localidad, es que están creciendo constantemente las familias y la cantidad de agua a utilizar es mucho mayor a la suministrada, el suministro de agua solo se realiza un día a la semana, por lo que las familias requieren de mejorar la línea con tubería, ya que la existente es de manguera y ya cumplió su vida útil, ocasionando varias fugas constantes, por lo que encarece el costo del servicio.

La localidad de TEZAHUAPA, cuenta con una cobertura de servicios básicos en Agua Potable, Drenaje, Electrificación, Salud, Comunicación (Telefonía u Otro), Urbanización y Educación.

Fotografías





Análisis de la Oferta Actual:

En la comunidad de TEZAHUAPA, Bo. EL ZAPOTE; se realizara la obra con las siguientes características :

Longitud: 499.00 ml de Tubería de PVC 2"

Cadenamiento: 0+000 al 0+499

Tipo de Terreno: Plano

tipo de material: Tipo B

Aspectos físicos:

línea y red de distribución de agua potable existente, es de sistema manguera, que ya cumplió, su vida útil, en mal estado, no se cuenta con toma domiciliaria, dentro del predio particular de cada vivienda

Se cuenta con caminos de terracería, electricidad, no hay drenaje.



Análisis de la Demanda Actual:

BENEFICIARIOS:

Directos : 110 habitantes

Indirectos : 442 habitantes

IV. Análisis de la Situación Sin Proyecto

Medida	Impacto
IMPLEMENTAR VÁLVULAS PARA REGULAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE	CONSISTE EN EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULAS DE COMPUERTAS PARA REGULAR EL SERVICIO DE LAS TOMAS DOMICILIARIAS EL MONTO DE LA MEDIDA DE OPTIMIZACIÓN ES: \$16,950.00

Análisis de la oferta sin proyecto *(considerando medidas de optimización)

Con la medida de optimizacion se tienen las siguientes características:

Longitud: 499.00 ml de Tubería de PVC 2"

Cadenamiento: 0+000 al 0+499

Tipo de Terreno: plano

tipo de material: tipo B

Aspectos físicos:

línea y red de distribución de agua potable existente, con la implementación de las válvulas se regulara las condiciones físicas de la red de agua potable, se podrá regular la presión del agua, así controlar el servicio de agua potable, permitiendo la reparación de las líneas, no se cuenta con toma domiciliaria, dentro del predio particular de cada vivienda.

Se cuenta con caminos de terracería, electricidad, no hay drenaje.

Análisis de la demanda sin proyecto *(considerando medidas de optimización)

BENEFICIARIOS:

Directos : 110 habitantes

Indirectos : 442 habitantes

*Se deberá realizar la estimación de los bienes y servicios relacionados con el PPI, proyectado a lo largo del horizonte de evaluación, considerando las optimizaciones identificadas.

V. Alternativas de Solución

Descripción	Costo
AMPLIACIÓN DE LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EL ZAPOTE.	\$226,000.00
AMPLIACIÓN DE LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE Fo.Go. EL ZAPOTE.	\$437,500.00

Justificación de técnica y/o económica de la alternativa seleccionada*



Se autoriza la Alternativa 1 debido a que es la mejor opción para satisfacer la necesidad planteada en la comunidad, el proyecto consiste en la AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EL ZAPOTE.

COMPARATIVO DE LAS ALTERNATIVAS:

Aspectos Técnicos: La ampliación de red de agua potable con tubería de P .V.C, es mejor opción que ampliación de red de agua potable con tubería Galvanizado, ya que las tuberías P.V.C. tiene mayor resistencia, mejor fluidez de rodamiento y deflexión, además cuentan con una capa de arena que recubre los tubos, esto soportan la corrosión. En cambio, la tubería de Galvanizada no tiene resistencia a estar oculto y por tal motivo el tiempo de vida es menor. El proceso de colocación para tubería P.V.C. es menor y fácil inspección., tiene la función estructural de soporte y distribuir la carga de los residuos sólidos como líquidos. En el aspecto constructivo será regido bajo las normal y reglamento de la instancia correspondiente de la CNA (N-CTR-1-04-009/06), respetando los valores específicos de diseño y calidad de los materiales en la ejecución, así como la calidad de los materiales pétreos bajo la norma N-CTM-2-02-002/02, los materiales pétreos se encuentran en la misma zona por lo cual se reducen costos y tiempo de ejecución .

Generará empleos a la localidad beneficiada ya que la obra no requiere mano de obra misma de la zona.

Aspectos Económicos: La ampliación de red de agua potable con tubería de P .V.C, es mejor opción que ampliación de red de agua potable con tubería Galvanizada, Esto se debe a que las tuberías de Galvanizada son a menudo de mano de obra intensiva y la de P .V.C. requiere menos trabajo manual. Al mismo tiempo, tubo de P.V.C. tiene una larga vida. Puede durar más de 35 años en muchas áreas rurales y más de 25 años en ambientes urbanos y costeros severamente expuestos. Por lo tanto, se necesitan menos costos de mantenimiento. La Red De Agua Potable tiene el valor más económico en su construcción que el de La Galvanizado, pero la durabilidad de su uso es mucho mayor, así como también su mantenimiento es menor y de bajo costo, se reducirán costos en el traslado así como el mantenimiento en de la red, en términos generales el Red De Agua Potable De P .V.C. es la alternativa adecuada para esta obra por los beneficios que otorga, además el mantenimiento no es tan constante como el que necesita el de tubería Galvanizado.


***Se deberán cuantificar sus costos y describir los criterios técnicos y económicos de la selección utilizados para determinar esta alternativa.**



VI. Análisis de la Situación con Proyecto

Descripción General del Proyecto:

CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE DISTRIBUCIÓN A BASE DE TUBERÍA DE P.V.C HIDRÁULICO CON CAMPANA RD-26 DE 50 MM (2"), CONSTRUCCION DE CAJAS DE VALVULAS Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES. LONGITUD DE 499.00 ML

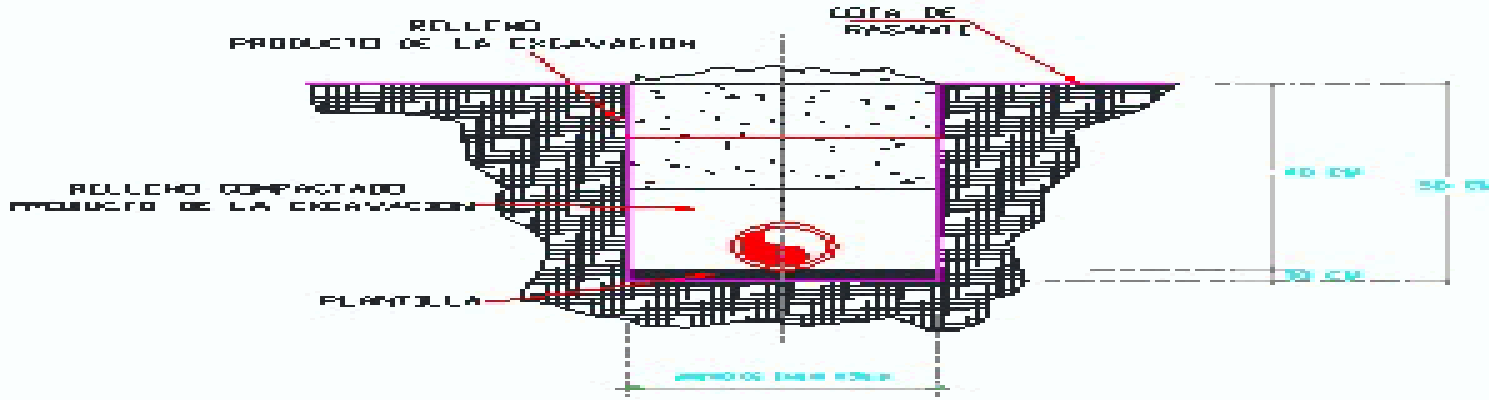

Descripción de los componentes



Componente	Descripción	Cantidad	Costo Unitario	Monto
1. PRELIMINARES	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MENORES DE 400 M2, EXCAVACION EN ZANJA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL SECO CLASE II, TODAS LAS ZONAS, CAMA DE ARENA, APISONADA CON PISON DE MANO, RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR Y RELLENO A VOLTEO UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION	274.45	187.66	51,505.2
2. TUBERIA	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE TUBO DE P.V.C. HIDRAULICO CON CAMPANA RD-26 DE 51 mm. (2"), CONSTRUCCION DE CAJA DE VALVULAS TIPO 2 DE 1.00 x 0.90 M. MEDIDAS INTERIORES PARA AGUA POTABLE, SUMINISTRO, COLOCACION Y PRUEBAS DE VALVULA DE COMPUERTA BRIDADA DE BRONCE DE VASTAGO FIJO CON VOLANTE DE 51 mm. (2" Y 4") Y SUMINISTRO, COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC PARA SU CORRECTA FUNCIONALIDAD DE CAJAS DE VALVULAS.	499.00	274.53	136,993.8
3. MAMPARA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CAL. 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1½" x 1/8 ", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1½" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.	1.00	6,328.50	6,328.5
Total		774.45	6,790.69	194,827.5
Deducciones:		IVA 16%		31,172.41
Gran Total:		226,000.00		

Aspectos Técnicos:

NMX-C-387-1993-SCFI, Industria de la construcción-Tubos y conexiones-Conexiones para toma domiciliaria de agua-Especificaciones de funcionamiento y métodos de prueba. NMX-E-143/1-SCFI-2002, Industria del plástico-Tubos de poli (cloruro de vinilo) (PVC) sin plastificante para el abastecimiento de agua a presión-Serie métrica-Especificaciones. NMX-E-145/1-SCFI-2002, Industria del plástico-Tubos de poli (cloruro de vinilo) (PVC) sin plastificante para el abastecimiento de agua a presión-Serie inglesa-Especificaciones. NMX-E-145/3-SCFI-2001, Industria del plástico-Tubos y conexiones-Conexiones hidráulicas de poli (cloruro de vinilo) (GALV.), con unión para cementar-Serie inglesa-Especificaciones.

Aspectos Ambientales:

DERIVADO AL OFICIO DE SEMARNATH/DGNA-021/2023 EMITIDO POR LA SEMARNATH CON FECHA 4 DE ENERO DEL 2023, CON RESPECTO AL PROCESO DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL PREVIO AL DESARROLLO DEL PROYECTO DE LA OBRA PUBLICA, NO APLICA OPINIÓN TÉCNICA O DICTAMEN AMBIENTAL.

Aspectos Legales:

El camino esta bien delimitado, no se afectan predios particulares o ejidales.



Micro



Coordenadas

Latitud	Longitud	Localidad
20.2693738711784	-98.64832451537993	1. INICIAL
20.2680252235616	-98.65011132692479	2. INTERMEDIO
20.2659472138312	-98.65097127863038	3. FINAL
20.2665862294433	-98.65018900468502	4. TANQUE AGUA 0+000 EXP. 2021
20.2668661390212	-98.65008864016791	5. EXP. 2021
20.2671005480529	-98.65055611328032	6. EXP. 2021
20.2688942341802	-98.649472464731	7. EXP. 2021
20.2694594189357	-98.64835401967909	8. EXP. 2021
20.2700849339977	-98.64852534156054	9. EXP. 2021
20.2795257530036	-98.6584263972322	10. EXP. 2021
20.2798510611109	-98.65817905366845	11. TERMINA AGUA 2+020 EXP. 2021

Análisis de la Oferta:



Con el proyecto se tienen las siguientes características:
Longitud: 499.00 ml de Tubería de PVC 2".
Cadenamiento: 0+000 al 0+499
Tipo de Terreno: plano
tipo de material: tipo B
Aspectos físicos:
Línea y red de distribución de agua potable, a base de suministro e instalación de tubería de P.V.C HIDRAULICO CON CAMPANA RD-26 DE 50 MM (2") . e instalaciones hidráulicas. incluye MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, dejando la obra en optimas condiciones para ser utilizada.
Se cuenta con caminos de terracería, electricidad, no hay drenaje.. con una longitud de 499.00 ml de tubería de 2" de PVC.
LA META DEL PROYECTO ES: 499.00 ML

Análisis de la Demanda:

BENEFICIARIOS:
Directos : 110 habitantes
Indirectos : 442 habitantes

Diagnóstico de la Situación con Proyecto:

La realización de esta obra permite cumplir el propósito de dotar de un mejor servicio de agua potable
En síntesis, con esta red de agua potable cumple con los siguientes aspectos:

- Mejor servicio de agua potable.
- Reducción en los costos de operación de la línea de agua potable.
- Conexión segura de las tomas domiciliarias.
- Mejorar los niveles de servicio.
- Mejora la imagen urbana.
- Mejora la calidad de vida.

Metas/Beneficiarios

Metas

Tipo de Población: K-Habitantes
Tipo de Beneficiario: 1-Habitantes
Unidad: METRO LINEAL
Cantidad: 499

Beneficiarios

	Hombres	Mujeres
Población Objetivo:	213	229
Beneficiarios Atendidos:	103	109
Beneficiarios Directos:	50	60
Beneficiarios Por Atender:	60	60



Indicadores Sociales INEGI/CONEVAL

Carencias Generales del Sitio

Tipo de Servicio	Municipal		LOCALIDAD		Observaciones
	Cobertura	Calidad	Cobertura	Calidad	
Agua Potable	85	BUENA	82	BUENA	
Drenaje	77	REGULAR	69	REGULAR	
Electrificación	94	BUENA	97	BUENA	
Salud	69	REGULAR	67	REGULAR	
Educación	91	BUENA	94	BUENA	

Indicador de Carencias:

ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA



VII. Identificación y Cuantificación de Costos y Beneficios

Solo para aquellos proyectos de infraestructura económica con un monto de inversión mayor a 30 mdp y hasta 50 mdp, se deberá incluir el Anexo 1(Cuantificación de costos, beneficios y cálculo de indicadores) como parte de la Ficha Técnica. adicionalmente a la siguiente información:

Tipo de Costo	Descripción y temporalidad	Meta	Importe	Periodicidad
Inversión	AMPLIACIÓN DE LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EL ZAPOTE.	M-499.00	\$ 226,000.00	UNICA
Costo de Mantenimiento	DESASOLVE (Consiste en retirar toda clase de arbusto o desperfecto que exista en la red de agua potable)y LIMPIEZA	499.00 ML	\$ 16,950.00	Una vez cada 5 AÑOS

VIII. Identificación de Beneficios

Beneficio	Descripción	Periodicidad
Social	Con esta obra se acelerara el bienestar de la comunidad de Atotonilco el Grande, por lo cual se ve reflejado en beneficios y un mejor desarrollo ala vivienda digna, tendrá una mejor imagen la comunidad, se mejoraran los servicios básicos y también la calidad de vida sera mucho mejor.	ANUAL (Generados durante la vida útil del proyecto)
Económico	Esta obra tendrá una mejoría en la economía de la población ya que no se preocuparan por el servicio de agua potable de cada domicilio y la plusvalía de los terrenos sera mucho mayor.	ANUAL (Generados durante la vida útil del proyecto)

*Se refiere a costos de Inversión, operación o mantenimiento

** Justificar en caso de difícil cuantificación y/o valoración

IX. Consideraciones Generales

Esta obra es de suma importancia ya que se solventa una de las necesidades básicas a la vivienda, dotar con un mejor servicio de agua potable y principalmente se mejorara el bienestar de los hogares, no tendrán que preocuparse por comprar pipas de agua potable y así dar una mayor calidad de vida para los usuarios, se logra un bienestar en la económicas de cada una de las familias y en lo social, con este tipo de proyecto se cumplen con los objetivos requeridos del PLAN ESTATAL DE DESARROLLO y así como ayudar al crecimiento de la infraestructura de los servicios básicos del estado.

Responsable de la información

Ramo: Aportaciones Federales
Entidad: Hidalgo
Areá responsable: 60 - Municipios 12 - Atotonilco el Grande



INDICADOR DE RESULTADOS

Organo Superior	60 - Municipios		
Unidad responsable	12 - Atotonilco el Grande		
Nombre del Indicador:			
Definición de Indicador	Método de Cálculo	Meta del Indicador	Fuente de Información del Indicador
	Algoritmo	Linea Base:	
		Meta del Proyecto:	
		Tiempo de Ejecución:	
		Tiempo de Medición	

Objetivo General del Plan Estatal de Desarrollo

